

MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
smunicipal@unicoban.gob.gt



LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- DE COBÁN, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, **CERTIFICA:** QUE TIENE A LA VISTA EL **LIBRO DE HOJAS MOVIBLES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- DE COBÁN, ALTA VERAPAZ EN EL QUE APARECE EL PUNTO TERCERO DEL ACTA NÚMERO 06-2021**, CELEBRADA CON FECHA VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EL QUE COPIADO LITERALMENTE DICE: -----

“TERCERO: Informe de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Primer Cuatrimestre, correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Abril del Ejercicio Fiscal 2021 e Informe de Avance físico de proyectos en ejecución. La Licenciada Blanca Lidia Claribel Rodríguez Cú, Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal, procede a realizar su presentación, dando una amplia explicación, como se detalla a continuación:

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, A.V.



I INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO - ABRIL EJERCICIO FISCAL 2021

BASE LEGAL

- ✓ DECRETO NUMERO 12-2002 -CODIGO MUNICIPAL-
ARTICULO 135. Información sobre la ejecución del presupuesto.
... Para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentara al Congreso de la Republica la liquidación de su presupuesto...

- ✓ DECRETO NUMERO 101-97 -LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO-
ARTICULO 47. INFORMES DE LA GESTION PRESUPUESTARIA: Para fines de consolidación de cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria...

INGRESOS
ENERO - ABRIL 2021


información
publico

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESO DEL PERIODO 2021
PERIODO: de ENERO a ABRIL

CLASE	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO PERCIBIDO	% DEL MONTO VIGENTE	% DEL TOTAL PERCIBIDO
10 - INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 14,132,780.81	Q 0.00	Q 14,132,780.81	Q 6,366,905.83	45.05%	15.41%
11 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 23,667,713.09	Q 0.00	Q 23,667,713.09	Q 6,317,368.45	26.69%	15.29%
13 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 22,785,942.77	Q 0.00	Q 22,785,942.77	Q 1,223,175.82	5.37%	2.96%
14 - INGRESOS DE OPERACION	Q 18,200,239.30	Q 0.00	Q 18,200,239.30	Q 4,104,528.38	22.55%	9.94%
15 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 2,794,967.61	Q 0.00	Q 2,794,967.61	Q 707,399.46	25.31%	1.71%
16 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 12,314,174.20	Q 944,588.21	Q 13,258,762.41	Q 2,828,870.99	21.34%	6.85%
17 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 67,699,519.63	Q 16,875,130.61	Q 84,574,650.24	Q 19,760,620.92	23.36%	47.84%
23 - DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 0.00	Q 43,760,251.06	Q 43,760,251.06	Q 0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	Q 161,595,337.41	61,579,969.88	223,175,307.29	41,308,869.85		100.00%

REPRESENTACION GRAFICA DE INGRESOS

INGRESOS ENERO - ABRIL 2021

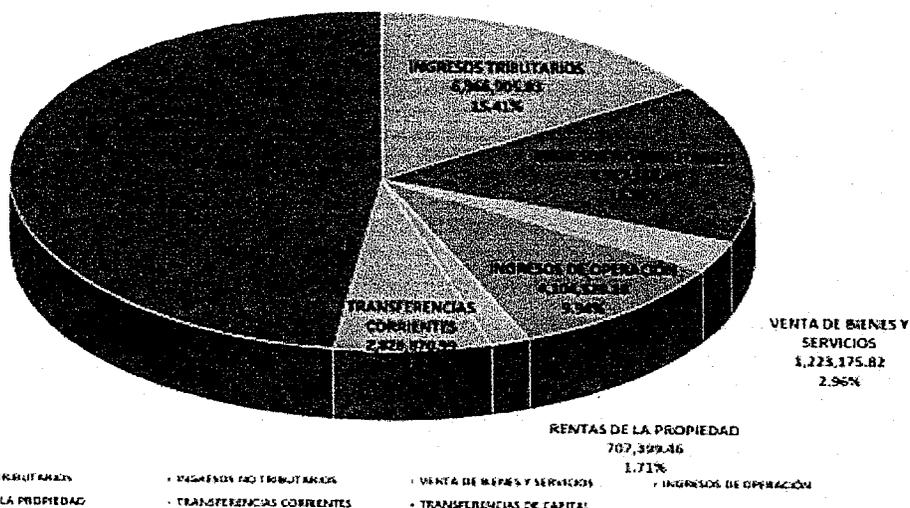

PORCENTAJE DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESOS DEL PERIODO 2021
CANTIDADES Y PORCENTAJES DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL
PERIODO: de ENERO a ABRIL


CLASE	PRESUPUESTO VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL VIGENTE	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
INGRESOS PROPIOS	81,581,643.58	18,719,377.94	22.95%	45.32%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,258,762.41	2,828,870.99	21.34%	6.85%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84,574,650.24	19,760,620.92	23.36%	47.84%
TOTAL	179,415,056.23	41,308,869.85		100.00%

EGRESOS POR PROGRAMA ENERO - ABRIL 2021

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR PROGRAMA, PRIMER CUATRIMESTRE DEL PERIODO 2021
PERIODO: de ENERO a ABRIL

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	APROBACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	% DEL MONTO VIGENTE	% DEL TOTAL
01	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 56,694,303.89	Q 2,727,759.15	Q 59,422,063.04	Q 16,989,765.48	28.59%	31.00%
11	DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q 10,000,000.00	Q 6,016,460.28	Q 16,016,460.28	Q 2,639,970.60	16.48%	4.82%
12	SANEAMIENTO BASICO	Q 28,248,079.80	Q 19,308,587.52	Q 47,556,667.32	Q 16,412,508.65	34.51%	29.95%
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q 0.00	Q 767,824.76	Q 767,824.76	Q 755,280.34	98.37%	1.38%
14	LOCAL DE CALIDAD	Q 0.00	Q 1,124,942.16	Q 1,124,942.16	Q 730,980.34	64.98%	1.33%
16	REDUCCION DEL DEFICIT HABITACIONAL	Q 14,192,707.72	Q 0.00	Q 14,192,707.72	Q 0.00	0.00%	0.00%
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 11,831,616.00	Q 3,936,534.97	Q 15,768,150.97	Q 4,900,558.23	31.08%	8.94%
19	PÚBLICOS	Q 1,003,000.00	Q 1,579,529.30	Q 2,582,529.30	Q 625,784.24	24.23%	1.14%
23	POBREZA EXTREMA	Q 39,125,830.00	Q 18,549,038.05	Q 57,674,868.05	Q 7,206,499.54	12.50%	13.15%
94	NATURALES Y CALAMIDADES	Q 0.00	Q 7,769,293.69	Q 7,769,293.69	Q 4,529,589.62	58.30%	8.27%
99	PROGRAMAS	Q 500,000.00	Q -200,000.00	Q 300,000.00	Q 12,000.00	4.00%	0.02%
TOTAL		Q 161,595,337.41	Q 61,579,969.88	Q 223,175,307.29	Q 54,802,937.04		100.00%

REPRESENTACION GRAFICA DE EGRESOS

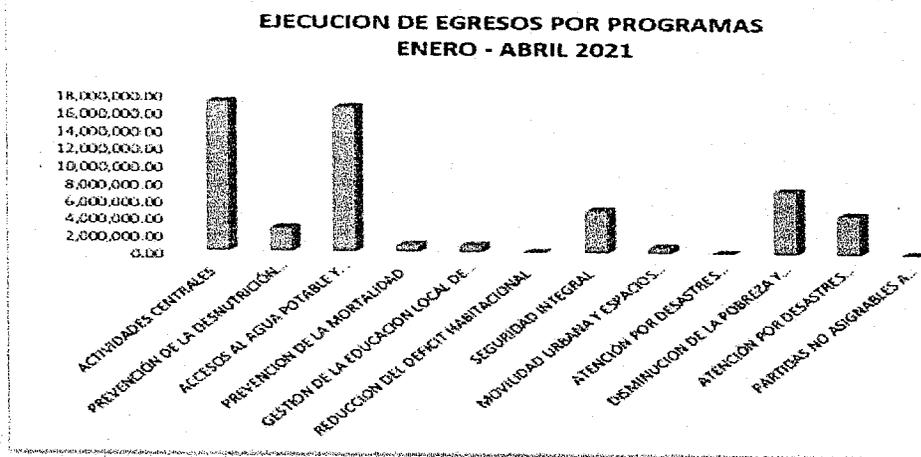

PORCENTAJES DE EJECUCION

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE EGRESO DEL PERIODO 2021
CANTIDADES Y PORCENTAJES: FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y DEUDA MUNICIPAL
PERIODO: de ENERO a ABRIL

CODIGO PROGRAMA	PROGRAMA	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL VIGENTE	% RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO
01	FUNCIONAMIENTO	Q 57,988,589.77	Q 16,577,824.13	28.54%	30.25%
11	INVERSION	Q 165,286,717.52	Q 38,225,912.91	23.13%	69.75%
TOTAL		Q 223,175,307.29	Q 54,802,937.04		100.00%



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
smunicipal@unicoban.gob.gt



EJECUCION DE PROYECTOS ENERO - ABRIL 2021


MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ
EJECUCION POR PROYECTOS ACTIVIDAD/OBRA DE INVERSION
PRIMER CUATRIMESTRE DE ENERO A ABRIL 2021

Nº	DESCRIPCION DEL PROYECTO ACTIVIDAD/OBRA	MONTO EJECUTADO	% RESPECTO AL TOTAL
1	AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD CASCO URBANO Y PERIURBANO COBÁN, ALTA VERAPAZ	4,049,025.68	10.71%
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) COLONIA SAN JOSE LA COLONIA A CASERIO SACANILLA, COBÁN, A.V.	3,834,354.77	10.14%
3	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBÁN, A.V.	3,773,606.00	9.98%
4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 3A CALLE ZONA 1, COBÁN, A.V.	2,678,559.84	7.09%
5	FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA PARA EL AREA RURAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	2,639,970.80	6.98%
6	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESFUERZO I, ZONA 12, COLONIAS LA FE CHIPOC Y CHECHOCHOC, ZONA 8, COBÁN, A.V.	2,618,733.19	6.93%
7	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, COBÁN, ALTA VERAPAZ	2,356,432.37	6.23%
8	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBÁN, A.V.	2,301,724.35	6.09%
9	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO ASFALTICO) DANADAS POR TORMENTA ETA E IOTA EN ZONAS 1, 2, 4, 5 Y 12 DEL AREA URBANA COBÁN, ALTA VERAPAZ	1,555,623.70	4.94%
10	MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE SERVICIOS), ZONA 6 COBÁN, ALTA VERAPAZ	1,843,955.92	4.88%
11	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBÁN, ALTA VERAPAZ	1,555,634.41	4.14%
12	CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	1,309,885.73	3.46%
13	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) TA. AVENIDA GUALOM, ZONA 11, COBÁN, ALTA VERAPAZ	825,652.37	2.18%
14	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DANADAS POR TORMENTAS ETA E IOTA, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBÁN, ALTA VERAPAZ	820,000.00	2.17%
15	AMPLIACION HOSPITAL DE COBÁN, CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E INTENSIVO NEONATAL, COBÁN, A.V.	755,280.34	2.00%
16	CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA, COBÁN, ALTA VERAPAZ	738,520.56	1.95%

EJECUCION DE PROYECTOS ENERO - ABRIL 2021

17	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO (BEB-INEO), BARRIO CANTON LAS CASAS, COBÁN, A.V.	738,880.34	1.93%
18	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	587,031.60	1.55%
19	MEJORAMIENTO PARQUEO, TERMINAL DEL NORTE, COBÁN, A.V.	521,433.51	1.38%
20	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBÁN, ALTA VERAPAZ	454,452.55	1.20%
21	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, COBÁN, A.V.	357,730.00	0.95%
22	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO SAN VICENTE ZONA 8, COBÁN, A.V.	317,327.50	0.84%
23	CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO), AREA URBANA Y PERIURBANA, COBÁN, ALTA VERAPAZ	174,900.63	0.46%
24	MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (INSTALACIONES), COBÁN, A.V.	174,307.49	0.46%
25	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBÁN, ALTA VERAPAZ	123,700.00	0.33%
26	CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (VERTICAL Y HORIZONTAL) AREA URBANA Y PERIURBANA, COBÁN, ALTA VERAPAZ	104,285.73	0.28%
27	CONSERVACION CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, COBÁN, A.V.	89,680.00	0.24%
28	SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESCHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBÁN, ALTA VERAPAZ	80,280.00	0.21%
29	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO SAMOCH, COBÁN, A.V.	54,950.00	0.15%
30	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, COBÁN, ALTA VERAPAZ	24,792.20	0.07%
31	CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO PERIODICO) PARA EL AREA URBANA Y PERIURBANA, COBÁN, ALTA VERAPAZ	18,349.00	0.05%
32	CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS), COBÁN, A.V.	9,075.37	0.02%
TOTAL EJECUTADO ENERO - ABRIL 2021		37,801,171.56	100.00%

MUNICIPALIDAD DE COBÁN, A.V.



I INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO - ABRIL EJERCICIO FISCAL 2021

El señor Alcalde Municipal Accidental consulta ¿si alguien tiene alguna duda? No existiendo ninguna intervención. El señor Alcalde Municipal Accidental le solicita al Director Municipal de Planificación Interino que proceda con su presentación. El Ingeniero Estuardo Enrique




MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL.

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
smunicipal@unicoban.gob.gt



Machuca Gil, Director Municipal de Planificación Interino, informa sobre el Avance físico de proyectos en ejecución, realizando su presentación, dando una amplia explicación, como se detalla a continuación:

MUNICIPALIDAD DE COBÁN



AVANCES EN PROYECTOS EJECUTADOS
POR LA MUNICIPALIDAD DE COBAN,
ALTA VERAPAZ

PROYECTOS FINALIZADOS 2,020 Y 2,021

- Construcción Instituto Básico Aldea Secocpur, Cobán, A.V.




AVANCE
FISICO
100%

- Mejoramiento Carreteras de Terracería Dañadas por Tormentas Eta e Iota, Área Urbana y Periurbana, Cobán, A.V.




AVANCE
FISICO
100%

- Construcción Instituto Básico y Diversificado INEB-INED Barrio Cantón Las Casas, Cobán A.V.



AVANCE
FISICO
100%

- Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas Barrio San Vicente, Zona 6, Cobán A.V.





AVANCE
FISICO
100%

- Mejoramiento Calle (PAVIMENTACION) 7^a. Avenida Gualom Zona 11, Cobán A.V.



AVANCE
FISICO
100%

- Mejoramiento Calle (PAVIMENTO ASFALTICO) dañadas por tormenta Eta e Iota en Zonas 1,2,4,5 y 12 del Área Urbana, Cobán A.V.




AVANCE
FISICO
100%

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2020 Y 2021





- Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, Planta de Tratamiento Aguas Residuales, Lotificación Chajchucub, Zona 11, Cobán, A.V.



AVANCE
FISICO
71.02%

- Construcción Sistema de Aguas Pluviales Colonia Esfuerzo Zona 12, Colonias La Fe Chipoc y Chichochoch Zona 5, del Municipio de Cobán, Departamento de Alta Verapaz

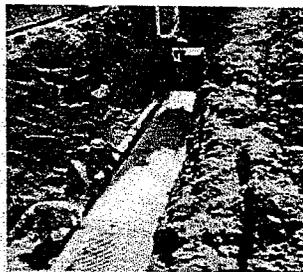

AVANCE
FISICO
87.81%



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL.

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
smunicipal@unicoban.gob.gt




- Mejoramiento Parqueo Terminal del Norte, Cobán, A. V.




AVANCE
FISICO
94.60%




- Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas del Estadio Verapaz, Zona 1 Cobán, Alta Verapaz

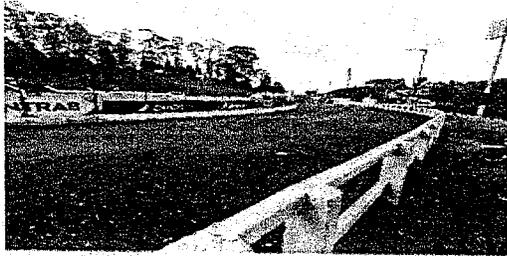


AVANCE
FISICO
90.50%

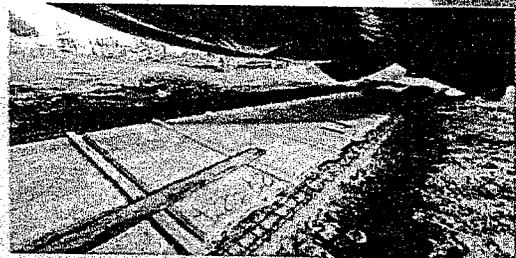

- Mejoramiento Calle (PAVIMENTACION) 2a. Avenida Entre 2a y 5a Calle Residenciales Imperial, Zona 7, Cobán, Alta Verapaz

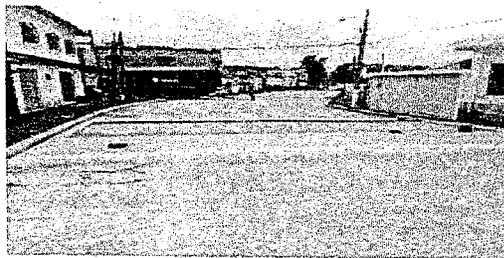


AVANCE
FISICO
52.52%

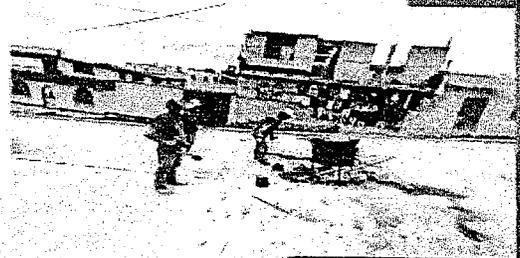

- Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial Lotificación Satis I y Colonia Municipal, Cobán, A.V.



AVANCE
FISICO
69.24%

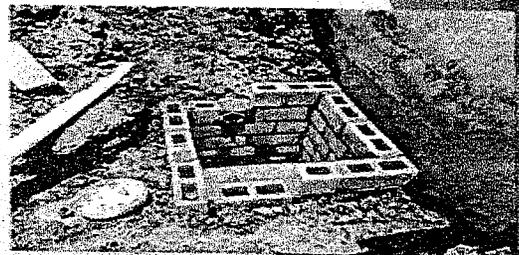




MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL.

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
smunicipal@municoban.gob.gt




- Ampliación Sistema (s) de Información para Centro de Monitoreo y Sistema de Seguridad, Casco Urbano y Peri Urbano Cobán, Alta Verapaz

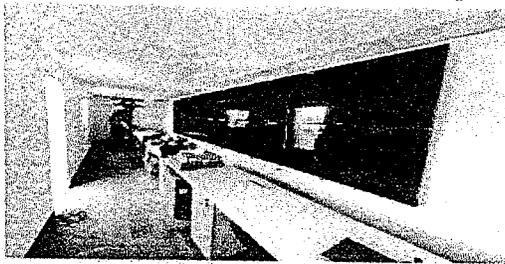

AVANCE FISICO
55.36%





- Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial Barrio San Jorge, Zona 10, Cobán, Alta Verapaz

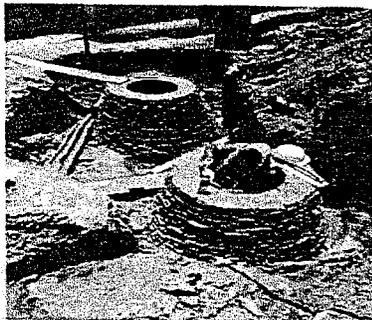



AVANCE FISICO
4.50%





- Mejoramiento Mercado Piso Plaza (Área de Comercio y de Servicios), Zona 6 Cobán, Alta Verapaz



AVANCE FISICO
70.38%

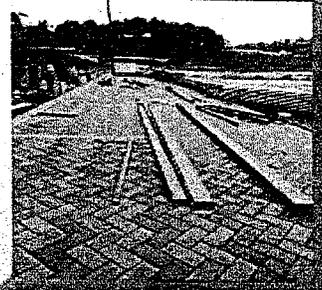

- Ampliación Carretera (PAVIMENTACION) Aldea San Pablo Xucaneb, Cobán, Alta Verapaz



AVANCE FISICO
2.00%






MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL.

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
smunicipal@municoban.gob.gt



- Fertilización Asistencia Alimentaria en la Actividad Productividad Agrícola para el Area Rural, Cobán, Alta Verapaz



AVANCE DE ENTREGA
34.36%



PROYECTOS EN EJECUCIÓN CONSEJO DE DESARROLLO






- Ampliación Hospital de Cobán Clínica de Atención Integral e Intensivo Neonatal, Cobán, A.V.



AVANCE FISICO
84.00%



- Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Zonas 12 y 5, Cobán, Alta Verapaz



AVANCE FISICO
58.41%





MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL.

SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
smunicipal@municoban.gob.gt




- Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial
3a. Calle, Zona 1, Cobán, A.V.



AVANCE
FISICO
70.54%



- Mejoramiento Camino Rural (PAVIMENTACION), Colonia
San José La Colonia a Caserio Sacanilla, Cobán, A.V.

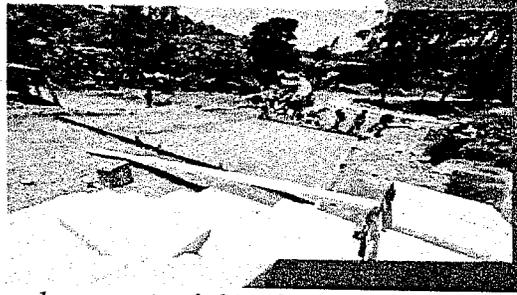

AVANCE
FISICO
90.02%



El señor Leopoldo Díaz, manifiesta que en relación al proyecto del Esfuerzo I a Chipoc Zona 5, ve problema, toda vez que no fue tomado en cuenta el sector de la Laguna de Los Jazmines, ya que por injerencia de una persona de la Municipalidad no fue tomado en cuenta, por lo que solicita se reconsidere la situación. El señor Arturo Ac Macz, Representante de la Instancia de Consenso del Pueblo Maya Q'eqchi', manifiesta que él considera que aún no se ha cumplido con el 100% de balastado de carreteras o si ese 100% corresponde a un sector. El Director Municipal de Planificación Interino manifiesta que la laguna a la que se refiere, está en el área de Chivencorral, comentando que sí se tiene contemplada esa área en una segunda fase, porque primero se tiene que solventar la situación legal de los terrenos donde está dicha laguna; en relación a la segunda intervención, aclara que hay varios proyectos por Administración que contemplan mantenimientos periódicos tanto en el área urbana y rural. El señor Ruben Pereira, manifiesta que en relación al proyecto de alcantarillado que va a desembocar a Chipoc, lo vienen gestionando desde el Gobierno anterior, hubieron muchas justificaciones para no tocar esa área de la laguna, sin embargo, los que tienen la parte legal de dicho terreno es el MAGA, ya que algunas personas han querido invadir esa área, pero como vecinos lo han defendido, porque es patrimonio de Cobán, solicitando al señor Alcalde Municipal en funciones que cuando se quiera inscribir esa área, que se verifique y se realice un estudio topográfico y catastral, para ver de donde se deriva ese uno por ciento de los derechos que quieren legalizar. El señor José Caal Botzoc, manifiesta que en relación al proyecto de pavimentación de San José La Colonia, solicita que se verifiquen las banquetas, porque se están quebrando, así mismo solicita que se supervisen los compantes y la tubería, para que pueda ser finalizado lo antes posible; en relación al balastado de calles, esperan que trabajen en su región; consulta ¿si se van a activar los semáforos?, tomando en cuenta que se han dado varios accidentes o de lo contrario que se quiten y se coloquen señales de precaución; aprovechando que están presentes los representantes de las instituciones, solicita el apoyo de la PNC y del Ejército en cuanto a prestar seguridad en su región. El Director Municipal de Planificación Interino, manifiesta que aún está en ejecución el proyecto



MUNICIPALIDAD DE COBÁN
CIUDAD IMPERIAL.


SECRETARÍA MUNICIPAL
7955-3232 Ext. 3182
smunicipal@unicoban.gob.gt

y previo a la recepción del proyecto, se deben rectificar las banquetas; en relación al semáforo, ahorita se le está dando mantenimiento. El señor Lepoldo Díaz, manifiesta que en relación al terreno de la laguna en Chivencorral, es un pulmón de la ciudad, pero hoy en día está siendo amenazado, que de manera anómala se quiere aprovechar de ese terreno y que con abogados han querido hacer valer documentos, realmente estas personas no tienen ninguna certeza, ya que esa área fue destinada desde un inicio como área verde, por lo que considera que si la Municipalidad no utiliza esa área para el paso de tubería, estaría avalando de alguna manera esa usurpación que pretenden esos vecinos. El señor Alcalde Municipal Accidental y Coordinador del Comude, manifiesta que en su oportunidad se hizo el estudio catastral y registral, estableciendo que pertenecía a lo que es el INTA, habiéndole dado seguimiento, actualmente corresponde al Fondo de Tierras, sin embargo, cuando se planteó el proyecto hubieron problemas y ahora que se está ejecutando el proyecto también hubieron problemas, porque llegaron personas fuertemente armadas amenazando al personal municipal y queriendo quemar la maquinaria, por lo que decidieron seguir el proyecto con la red principal para que no sea suspendido, dejando dicha área para la segunda fase. El señor Alcalde Municipal Accidental consulta ¿si tienen alguna otra pregunta? No existiendo ninguna otra intervención. El señor Alcalde Municipal Accidental y Coordinador del COMUDE, manifiesta que derivado de las presentaciones realizadas, el Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE- queda enterado del Informe de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Primer Cuatrimestre, correspondiente al periodo del 01 de Enero al 30 de Abril del Ejercicio Fiscal 2021 e Informe de Avance físico de proyectos en ejecución.'''' -----

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL, CONTENIDA EN ONCE HOJAS CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD, EN EL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, A VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. -----


LICDA. AURA VIOLETA REY YALIBAT
SECRETARÍA MUNICIPAL / SECRETARIA COMUDE




Vo. Bo. EDUARDO ARIEL HASSE ROSALES
ALCALDE MUNICIPAL ACCIDENTAL / COORDINADOR DEL COMUDE



UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA
MUNICIPAL
RECIBIDO
24 MAY 2021
HORA: 14:47 POR: 
